

Relatório de Análise Parceria Público-Privada

Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando
Ferrari (CAFF)

Análise sob a ótica do ente público · Value for Money positivo

VALUE FOR MONEY

**R\$ 188,5
mi**

COMPROMETIMENTO
RCL

0,49%

INVESTIMENTO

R\$ 1,33 bi

PRAZO

30 anos

Poder concedente

Estado do Rio Grande do Sul — SERG / SPGG

Modalidade

Concessão Administrativa (Lei nº 11.079/2004)

Estruturação

BNDES (OCS 330/2024) · Consórcio RECAFF

Data de emissão

23 de junho de 2026

01 Sumário Executivo

Análise de vantajosidade (*Value for Money*) da Concessão Administrativa (PPP, Lei nº 11.079/2004) para reforma, equipagem, operação e manutenção do Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), sob a ótica do ente público. Comparação, a valor presente, entre a execução pela PPP e pela contratação tradicional (*Public Sector Comparator*), com a mesma qualidade e escopo.

VALUE FOR MONEY

R\$ 188,5 mi

PPP 9,9% mais barata que o PSC

CUSTO DA PPP (VPL)

R\$ 1.716,2 mi

vs PSC R\$ 1.904,7 mi

COMPROMETIMENTO DA RCL

0,49%

limite legal 5,0% — folga confortável

CONTRAPRESTAÇÃO MÁXIMA

R\$ 262,3 mi

R\$ 21,86 mi/mês

INVESTIMENTO (CAPEX)

R\$ 1,33 bi

R\$ 5,7 mil/m² · prazo 30 anos

TAXA DE DESCONTO (TSD)

8,5%

real a.a. · WACC privado 10,23%


Conclusão Projeto com **Value for Money positivo e robusto e impacto fiscal suportável**, com melhorias qualitativas essenciais (transferência de riscos, qualidade aferida por Verificador Independente, celeridade). Preenchimento classificado como **"Adequado com ressalvas"**.

02 Identificação do Projeto

ITEM	DESCRIÇÃO
Objeto	Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) — reforma, equipagem, operação e manutenção e exploração de receitas acessórias
Poder concedente	Estado do Rio Grande do Sul — SERG / SPGG
Modalidade	Concessão Administrativa (PPP, Lei nº 11.079/2004)
Prazo / data-base	30 anos · data-base dez/2025 · Porto Alegre/RS
Estruturação	BNDES (OCS 330/2024) · Consórcio RECAFF
Análise / responsável técnico	CAGE / SEFAZ-RS — Contadoria e Auditoria-Geral do Estado — ótica do ente público

03

Análise Econômico-Financeira e Value for Money

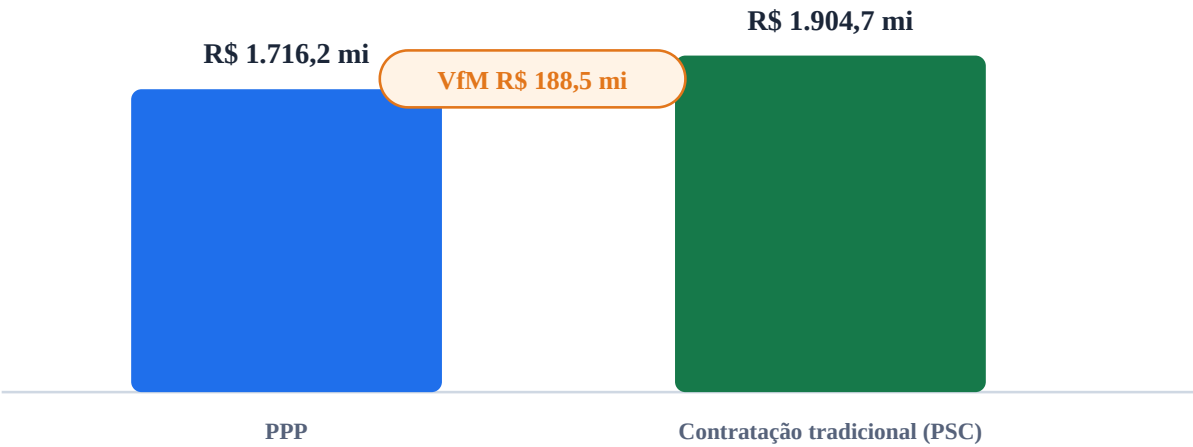

Composição do PSC (contratação tradicional)

Investimentos + Despesas (PSC bruto)	+ 1.606,3
Aditivos contratuais (sobrecusto 25%)	+ 401,6
Custo de transação (18 contratos)	+ 1,5
Atraso de obras (iPrazo RS 3,27)	+ 16,3
Obtenção de receitas acessórias	- 121,0
Custo da contratação tradicional	1.904,7

Composição do custo da PPP

Contraprestação (VPL)	+ 2.173,7
Gestão contratual	+ 4,9
Neutralidade competitiva (tributos)	- 462,4
Custo da PPP	1.716,2


Divergência registrada: o resultado do VfM é R\$ 188,5 mi no modelo financeiro (16/03/2026) e na apresentação ao CGCPPP (17/03), e R\$ 192,7 mi no Produto 10 (10/03). Fonte preferível: modelo financeiro (mais recente). Recomenda-se conciliar antes do edital.

Análise de sensibilidade do VfM

FATOR DE EFICIÊNCIA COMERCIAL	VFM (R\$ MI)
75% (-25%)	174,0
70% (-30%)	183,3
65% (-35%) — base	192,7

VfM permanece positivo em todos os cenários — resultado robusto.

Capacidade fiscal (Affordability)



04 Custos Imputáveis ao Estado

Avaliados 45 custos potenciais do ente público (checklist completo no anexo). Principais itens:

CUSTO POTENCIAL	PREVISTO	VALOR ESTIMADO	RESPONSÁVEL
Contraprestacao publica	Sim	R\$ 262,3 mi/ano	Estado
Garantias publicas	Sim	Nao quantificado	Estado
Fiscalizacao contratual	Sim	R\$ 453,4 mil/ano (VPL 4,9 mi)	Estado
Verificador independente	Sim	Nao isolado	Estado
Desapropriacoes	Nao	R\$ 0 (estimado)	-
Licencas ambientais	Sim (parcial)	Nao quantificado	Compartilhado/Privado
Reequilibrios economico-financeiros	Sim	Contingente	Estado
Bens reversiveis	Sim	-	Estado (recebe)
Custos tributarios	Sim	-R\$ 462,4 mi VP (ajuste)	Estado (sociedade)
Impacto fiscal de longo prazo	Sim	R\$ 262,3 mi/ano	Estado
Limite legal de comprometimento da RCL	Sim	Limite 3.261,65 mi	Estado
Participacao social / consulta / audiencia publica	Sim	Nao quantificado	Estado

Não aplicáveis: desapropriações (terreno público), aporte público, subsídios, reassentamentos, seguros (do privado). Possivelmente subestimados: verificador independente e monitoramento de KPIs (previstos, sem valor isolado).

05 Matriz de Alocação de Riscos

ALOCÇÃO	CATEGORIAS DE RISCO
● Transferidos ao parceiro privado	Projeto, Engenharia/Construção, Financiamento, Operação e Manutenção, Ciclo de vida do ativo, Ambientais vinculados à execução, Econômico-financeiros ordinários
● Retidos pelo Estado	Riscos políticos e soberanos, força maior política, passivos ambientais pré-existent
● Compartilhados	Força maior natural (enchentes 2024), mudança de legislação, licenciamento ambiental, refinanciamento

Alocação conforme matriz típica de referência; o Anexo VII (Matriz de Risco) do contrato não foi detalhado nos documentos analisados. Mitigações apoiadas no mecanismo de pagamento ($CME = CMMáx \times FDISP \times FID$), penalidades e garantia pública (FPE/RRF).

06 Melhorias Qualitativas Esperadas

MELHORIA (SITUAÇÃO ESPERADA COM A PPP)	RELEVÂNCIA	MENSURÁVEL	EVIDÊNCIA
Transferencia de riscos ao privado Riscos de projeto/construção/financiamento/O&M/ciclo de vida/ambiental transferidos ao privado	Essencial	Não (qualitativo)	p.13-14 (2.1)
Garantia do nível de qualidade do serviço Indicadores de desempenho + Verificador Independente + penalidades; remuneração atrelada a performance	Essencial	Sim	VfM p.15 / apr. p.17,24
Celeridade na entrega Remuneração só após operação; alinhamento de incentivos para entrega no prazo	Essencial	Sim	p.11,15,28
Alocação mais eficiente de recursos Contrato único integrado (projeto+obra+O&M)	Alta	Sim	VfM p.16 / apr. p.31
Reversibilidade do ativo Reversão ao Estado em padrão de desempenho adequado após 30 anos	Alta	Não	p.16 (2.4)
Modernização da infraestrutura administrativa Instalações modernas, seguras e sustentáveis	Alta	Parcial	p.5
Resiliência climática Novas diretrizes de drenagem e infraestrutura verde	Alta	Não	p.5-6
Requalificação urbana Abertura à cidade, integração à malha urbana de Porto Alegre	Média	Não	p.4-6,29-34
Centralização de secretarias Centralização no complexo, fim de alugueis externos	Alta	Sim	apr. p.5 / XLISM '12' D30-D41

Como o VfM já é positivo, as melhorias qualitativas **reforçam** a decisão. As três essenciais justificariam a PPP mesmo num cenário de VfM marginal (orientação EPEC/CP3P).

07 Conclusão e Recomendações

O projeto apresenta **Value for Money positivo (R\$ 188,5 mi; 9,9%)**, **affordability folgada (0,49% da RCL)** e **melhorias qualitativas essenciais**, com transferência adequada de riscos ao parceiro privado. Persistem lacunas no custo atual desagregado e na precificação analítica da obra.

Classificação do preenchimento: Adequado com ressalvas. Apto a uso preliminar/instrução, condicionado à resolução das pendências abaixo.

Pendências para validação humana

- Conciliar a versão do VfM (R\$ 192,7 mi × R\$ 188,5 mi) e adotar a definitiva.
- Definir a RCL de referência (R\$ 65.233 mi × R\$ 56.500 mi) e recalcular o comprometimento.
- Obter e auditar o orçamento analítico da obra (composições, BDI, ART/RRT).
- Detalhar a Matriz de Risco (Anexo VII) e validar a alocação item a item.
- Quantificar verificador independente e monitoramento de KPIs.
- Avaliar, na decisão, o cenário híbrido (obra privada + operação pública), de custo inferior.
