

CONSELHO GESTOR

PROGRAMA DE CONCESSÕES E

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

17 DE MARÇO DE 2026



43ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PAUTA

1

PPP do CAFF

Apresentação do projeto de PPP do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)
Para deliberação: Inclusão do projeto no Programa de Concessões e PPPs e abertura da consulta pública

2

Assuntos gerais

Bloco 1 | Cais Mauá | Dia "D" das Concessões e PPPs

Projeto de Parcerias Público Privada Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

Reunião com Conselho Gestor do
Programa de Concessões e
Parcerias Público-Privadas do
Estado do Rio Grande do Sul –
CGCPPP/RS



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL



VISÃO GERAL DA PPP DO CAFF

A PPP é uma alternativa eficiente para a requalificação e modernização da infraestrutura administrativa do Estado

1

Objetivo

Delegação, por meio de parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa, da prestação dos seguintes serviços no Complexo do CAFF:

1. Serviços de Construção
2. Serviços de Reforma
3. Serviços de Manutenção
4. Serviços de Zeladoria

2

Resumo do projeto

- Retrofit do CAFF / SEDUC e DAER, construção de novos edifícios (PGE, Garagens, áreas comerciais), equipagem e operação
- Investimento: R\$ 1,33 bilhão | Prazo: 30 anos
- Contraprestação mensal máx.: R\$ 21,86 milhões | TIR real: 10,23%
- Requalificação urbana: abertura do complexo à cidade e integração com a malha urbana de Porto Alegre

3

Divisão das responsabilidades

- **Concessionária:** Responsável pelas obras, retrofit, manutenção predial, operação e gestão de facilities do complexo
- **Estado:** Regulação, fiscalização e atividades-fim das secretarias instaladas no CAFF

BENEFÍCIOS



Modernização da infraestrutura administrativa com instalações modernas, seguras e sustentáveis.



Maior controle e transparência, por meio da aplicação de indicadores de desempenho e atuação do Verificador Independente.



Centralização de secretarias e órgãos, agilizando o atendimento ao cidadão e reduzindo custos com aluguéis.



Economia de R\$ 188,5 mi (VfM) em relação à contratação tradicional. **Preservação do caixa do Estado**



Requalificação urbana: retirada das cercas e integração com a **malha urbana de Porto Alegre**



Resiliência climática: novas diretrizes de drenagem e infraestrutura verde após enchentes de 2024.

DIRETRIZES URBANÍSTICAS E PROJETAIS

1. Reconhecimento da relevância do patrimônio arquitetônico
2. Sustentabilidade como princípio orientador
3. Melhoria da Malha Viária e Mobilidade
4. Planejamento e Ocupação Urbana eficientes
5. Eficiência das infraestruturas



DENSIDADE POPULACIONAL E VAGAS DE ESTACIONAMENTO

DENSIDADE POPULACIONAL

Racional de dimensionamento

A partir do dimensionamento mínimo de uma estação de trabalho individual, acrescentam-se áreas complementares: zonas de aproximação, circulações gerais, salas de reuniões e espaços de apoio.

Atualmente, o CAFF conta com 3.862 estações de trabalho e projeta-se um total final de 6.766 de estações.

Critério adotado

1 pessoa a cada 8m² de área privativa, estabelecendo um padrão confortável de utilização do espaço.

Resultado: a densidade adotada garante conforto, funcionalidade e conformidade com boas práticas de ocupação de edifícios administrativos.

VAGAS DE ESTACIONAMENTO

Referência normativa

Anexo 10.1 do PDDUA de Porto Alegre: 1 vaga a cada 50m² de área adensável.

Cálculo

$162.500\text{m}^2 \div 50 = 3.250$ vagas sugeridas pelo PDDUA

3.263 vagas projetadas
(Aumento de 140,8%)

Anexo 10.1 PDDUA integralmente atendido

ORGANIZAÇÃO DOS SUBCONDOMÍNIOS

O projeto está organizado em um Condomínio Geral (áreas externas comuns) e sete subcondomínios onde se distribuem as edificações de diferentes tipologias.

1 CAFF e SEDUC
Área privativa: 71.861,81 m² | População: 6.766 | Estacionamento: 369 vagas

2 Edifício C (PGE)
Área privativa: 20.985,71 m² | População: 1.974 | Estacionamento: 238 vagas

3 Edifício D (Garagem)
Área privativa: 14.775 m² | Estacionamento: 1.182 vagas

4 Edifícios E, F, G e H (Serviço)
Área privativa: 18.753,38 m² | População: 866 | Estacionamento: 866 vagas

5 Edifício I (Praça Comercial)
Área privativa: 552,39 m² | Lojas, restaurantes e serviços

6 Edifícios J, K, L e M
Área privativa: 8.186,95 m² | População: 647 | Estacionamento: 221 vagas

7 Edifícios N e O (DAER)
Área privativa: 22.214,21 m² | População: 2.389


* Existem ainda 367 vagas descobertas, ao longo do terreno do CAFF / A escola comportará 150 crianças.

IMPLANTAÇÃO



MASTERPLAN

Para a definição das estimativas dos custos Operacionais (OPEX) considerou-se a criação de um Condomínio Geral (áreas externas comuns a todas as edificações) e 7 sub condomínios nos quais se distribuem as edificações totalizando 17 edificações entre escritórios, garagens e áreas de serviços.

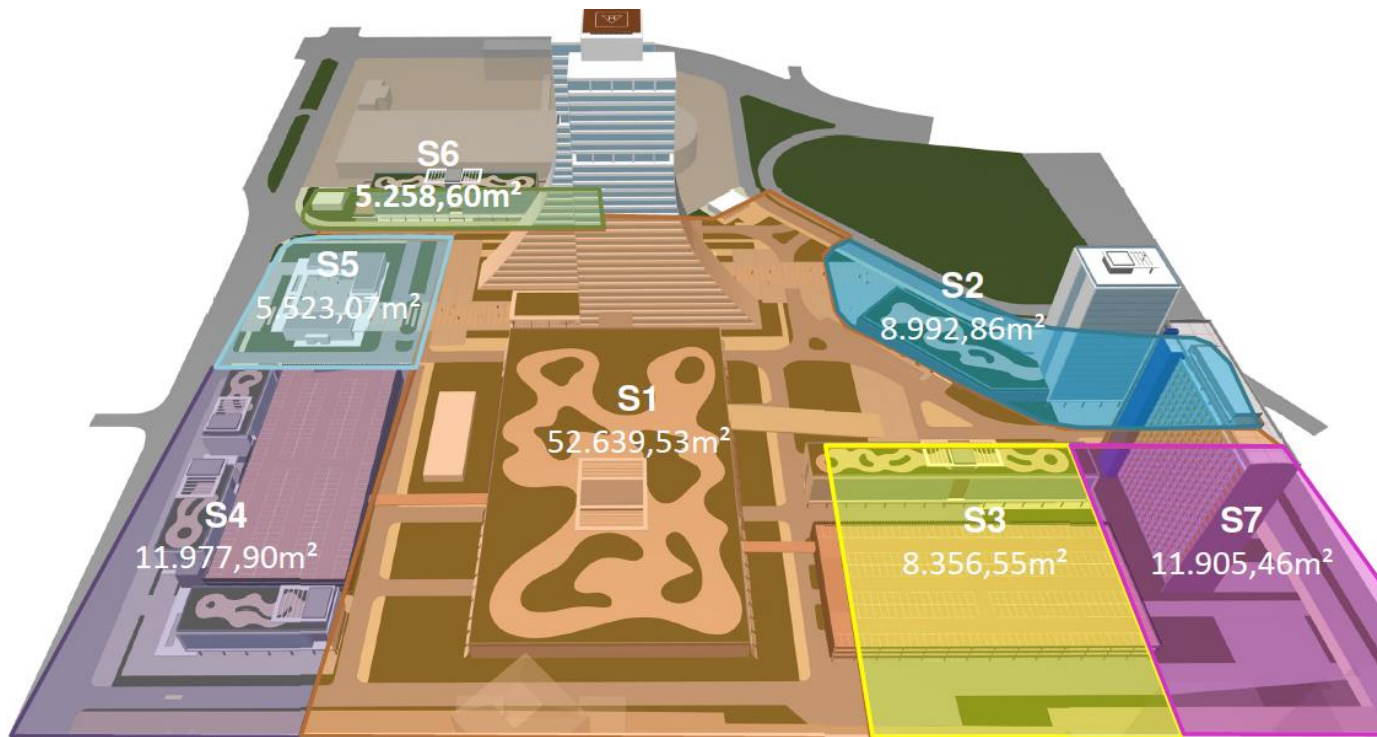

MASTERPLAN

EDIFÍCIO A – CAFF (RETROFIT)

- TÉRREO: APOIO
- 1º PAV.: ACESSO
- 20 PAVTOS
- 22º ROOFTOP
- 6 ANDARES TIPO
- ANDAR DUPLEX
- HELIPONTO

EDIFÍCIO B-SEDCU (RETROFIT)

- TÉRREO: ESTACIONAMENTO E PRAÇA DE CONVIVÊNCIA
- 1º PAV: ARQUIVO/ VEST./ DEP./
- 2º PAV: REUNIÕES

EDIFÍCIO C (PGE):

- TÉRREO: LOBBY ACESSO E LOJAS;
- 3 PAVTOS ESTACION.
- 17 TIPOS
- ROOFTOP

EDIFÍCIO D


- 4 PAVTOS.:ESTACION.

EDIFÍCIO E (SERVIÇO):

- TÉRREO: LOBBY
- 3 TIPOS
- ROOFTOP

EDIFÍCIOS F e G

- (SERVIÇO):
- TÉRREO: ACESSO E LOJAS
- 3 TIPOS
- ROOFTOP

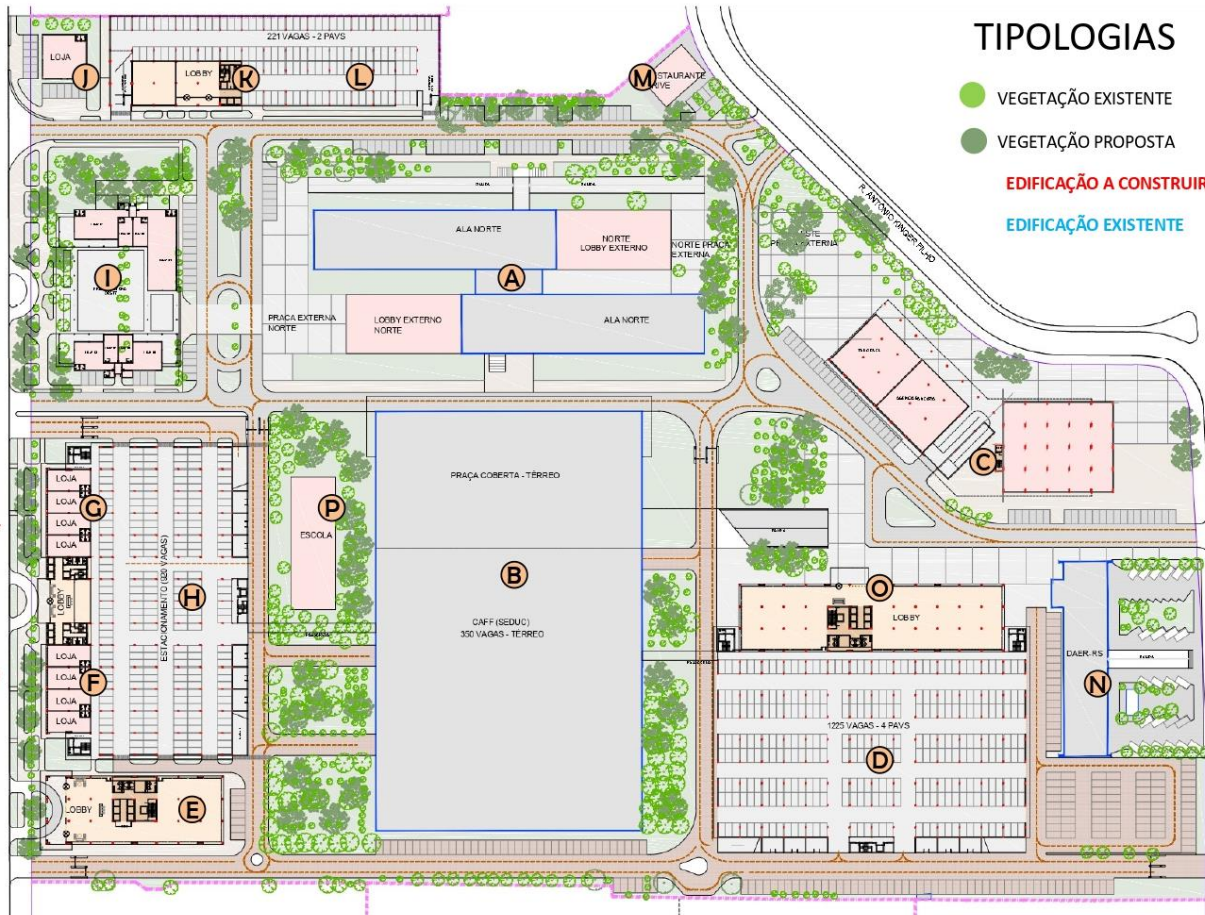

TIPOLOGIAS

● VEGETAÇÃO EXISTENTE

● VEGETAÇÃO PROPOSTA

EDIFICAÇÃO A CONSTRUIR

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

TORRE H

- 4 PAVTOS.:ESTACION

PRAÇA COMERCIAL - I:

- RESTAURANTE
- BAR/LANCHERIA
- SERVIÇO

LOJAS J e M:

- LOJA/RESTAURANTE COM DRIVE

TORRE K (SERVIÇO)

- TÉRREO: LOBBY,LOJA
- 4 TIPOS
- ROOFTOP

TORRE L

- 02 PAVTOS.:ESTACION.

EDIFÍCIO N – DAER

- (RETROFIT)
- TÉRREO: APOIO
- 1º PAVTO: ACESSO
- 17 TIPOS
- ROOFTOP


TORRE O (SERVIÇO):

- TÉRREO: LOBBY ACESSO
- 3 TIPOS
- ROOFTOP

ESCOLA – P:

- 2 BERÇÁRIOS E 4 SALAS INFANTIS
- NUTRI/REF./COZ./DEP.
- AMAM./LACT./FRALD.
- WCS INF. E ADULTO
- SEC. PROF. /COORD./DIR.
- BIBLIOT./ PÁTIO / SOLÁRIO

MASTERPLAN - EDIFÍCIO "SEDUC"

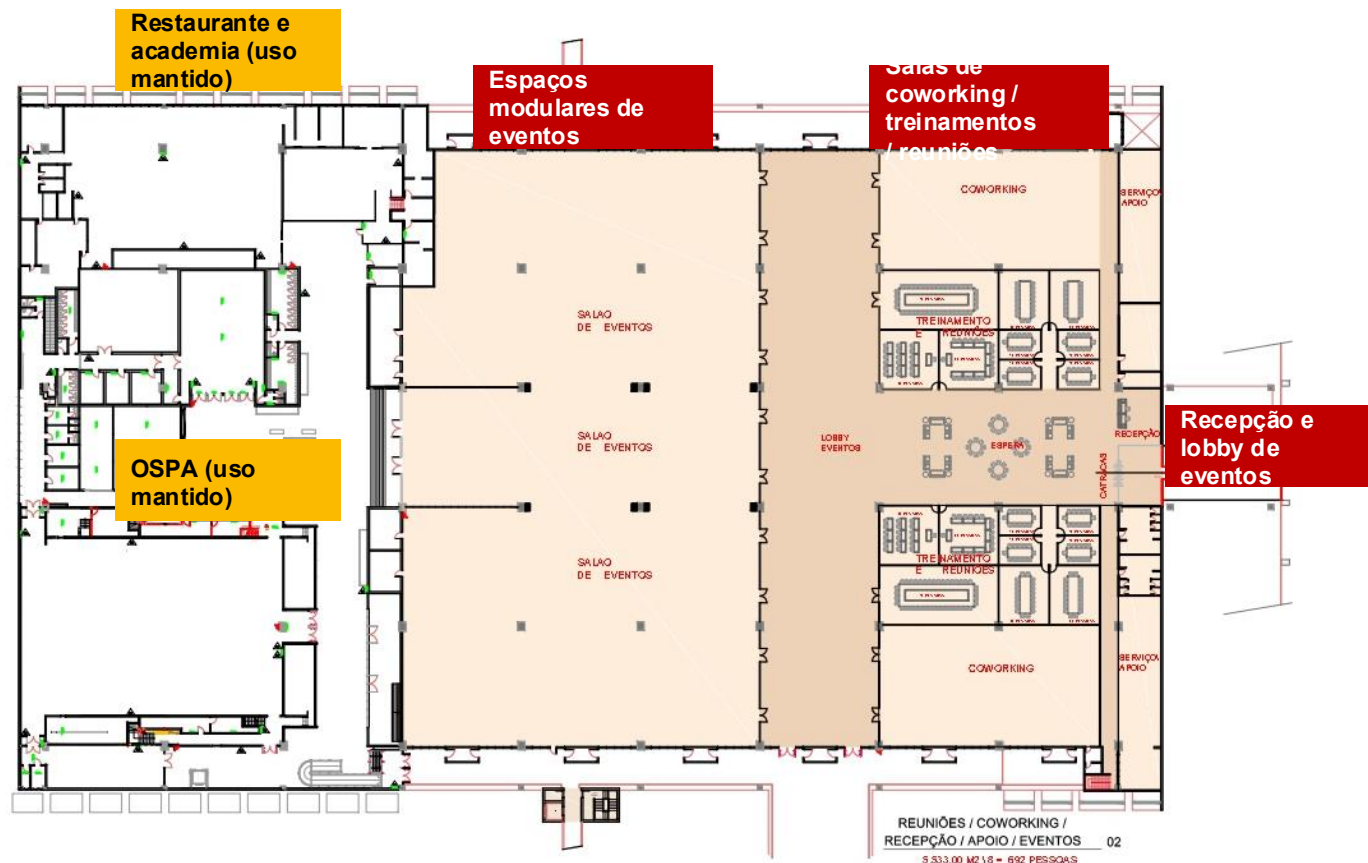

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO



SERVIÇOS

Foram utilizados como benchmarks os empreendimentos: **RJ:** Ventura Corporate, Edifício Senado; **RS:** CAFF, Centro Empresarial Guaíba; **SP:** 17007 Nações, Birmann 20, CENU Torre Norte, Parque da Cidade, WTMorumbi.



Manutenção

Manutenção civil, elétrica, hidráulica, bombas e motores, telefonia e infraestrutura de dados.



Ar Condicionado

Manutenção de ar-condicionado (HVAC) e materiais associados



Limpeza e Conservação

Limpeza de áreas comuns e privativas, sanitários, vidros, coleta de resíduos e higienização conforme NR-06 e ANVISA RDC 216/2004



Serviços de apoio

Copeiro, garçom, mensageiro.



Mobiliário

Disponibilização do mobiliário para equipar os espaços de trabalho. Mecanismo de contraprestação complementar s superada a banda.



Segurança Patrimonial

Controle de acesso 24h, vigilância, monitoramento CFTV, rondas preventivas, brigada de incêndio e gestão de emergências



Jardinagem

Manutenção de áreas verdes, jardins, gramados, poda, adubação e controle fitossanitário conforme NBR 16629



Utilities

Energia elétrica (com migração para ACL), água e esgoto.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

RECAFF - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																								03/02/2026		
		1 TRI	2 TRI	3 TRI	4 TRI	5 TRI	6 TRI	7 TRI	8 TRI	9 TRI	10 TRI	11 TRI	12 TRI	13 TRI	14 TRI	15 TRI	16 TRI	17 TRI	18 TRI	19 TRI	20 TRI	21 TRI	22 TRI	23 TRI	24 TRI	
FASE 1	S01-A - CAFF / AMPLIAÇÃO	2,28M	3,68M	4,67M	4,14M	3,11M	9,77M	11,14M	43,15M																	81,94M
	S02-C- PGE		2,71M	12,91M	20,29M	9,85M	17,61M	26,07M	23,35M	74,05M																186,83M
	S03-D ED. GARAGEM	3,06M	27,53M	39,94M	11,45M	4,84M	4,04M	1,74M	2,84M																	95,44M
	S07-O			0,87M	3,17M	5,11M	2,89M	5,52M	9,95M	10,38M	13,57M															51,46M
	IMPLANTAÇÃO								3,64M	4,62M																8,27M
	IMP-P	0,25M	0,41M	0,70M	0,40M	0,45M	0,66M	0,70M	1,04M																	4,60M
	PRAZO ESTIMADO: 30 MESES																							TOTAL FASE 1	428,52M	
FASE 2	S01-A - CAFF RETROFIT					20,48M	20,48M	20,48M	20,48M	20,48M	20,48M	20,48M	20,48M	20,48M	20,48M	20,48M										245,81M
	S01-B - SEDUC									1,45M	0,18M	2,27M	3,53M	6,94M	10,21M	9,68M	71,37M									105,64M
	S06- KL - ED.GARAGEM								1,71M	7,18M	10,93M	4,14M	4,15M	6,92M	6,89M	9,52M										51,45M
	S07-N - DAER									0,86M	0,15M	1,33M	2,74M	6,43M	7,92M	6,32M	40,10M									65,86M
	IMPLANTAÇÃO															4,70M	6,96M									11,66M
	PRAZO ESTIMADO: 36 MESES																							TOTAL FASE 2	480,41M	
FASE 3	S04-F, G																0,61M	1,72M	2,87M	1,73M	2,50M	6,11M	7,56M	9,69M		32,78M
	S04-E																0,65M	2,08M	3,43M	2,15M	3,87M	7,39M	8,07M	10,47M		38,11M
	S04-H															2,15M	21,20M	30,78M	8,79M	3,53M	3,07M	1,49M	2,43M		73,43M	
	S05-I													0,32M	0,45M	0,78M	0,48M	1,38M	1,36M	1,76M	2,56M				9,09M	
	S06-J-M													0,33M	0,19M	0,36M	0,33M	0,84M	0,62M	0,71M	1,05M				4,42M	
	PRAZO ESTIMADO: 33 MESES																							TOTAL FASE 3	157,84M	

FASE 1
 ÁREA CONSTR: 87.748,75m²
 ÁREA URBANIZ: 52.326,50m²
 POPULAÇÃO: 4.272
 VAGAS: 1.604

FASE 2
 ÁREA CONSTR: 126.407,08m²
 ÁREA URBANIZ: 52.326,50m²
 POPULAÇÃO: 7.654
 VAGAS: 793

FASE 3
 ÁREA CONSTR: 35.942,52m²
 POPULAÇÃO: 866
 VAGAS: 866

CONTRATO DE CONCESSÃO

OBJETO

Reforma, equipagem, operação e manutenção do Centro Administrativo Fernando Ferrari no Município de Porto Alegre/RS.

PRAZO

30 anos

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

- Pagamento da obra ou serviço efetuado diretamente pelo Poder Concedente;
- Instituição de mecanismo de garantia pública referente aos pagamentos devidos à Concessionária;
- A modalidade de licitação é concorrência;
- Riscos do empreendimento são compartilhados entre as partes a partir da definição de uma matriz objetiva de alocação;
- Possibilidade de exploração de receitas acessórias.

Anexos do Contrato

Anexo I	EDITAL E ANEXOS
Anexo II	PROPOSTA COMERCIAL
Anexo III	CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA
Anexo IV	SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO
Anexo V	DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Anexo VI	MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO
Anexo VII	MATRIZ DE RISCO
Anexo VIII	PENALIDADES
Anexo IX	CONTRATO DE VINCULAÇÃO DE RECEITAS, NOMEAÇÃO DE AGENTE DE GARANTIA E ADMINISTRAÇÃO
Anexo X	DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS INDEPENDENTES.

VISÃO GERAL

O desempenho da Concessionária será mensurado através do **Índice de Desempenho (ID)**, que reflete à eficiência **na execução dos serviços**. A Contraprestação Mensal Efetiva será calculada proporcionalmente ao resultado deste índice, avaliado por um Verificador Independente.



Verificação Independente

Aferição realizada mediante insumos coletados junto à Concessionária e visitas de campo aos edifícios do complexo CAFF, conforme periodicidade determinada para cada indicador.



Relatório Trimestral

O Verificador Independente consolida relatórios trimestrais com apuração dos indicadores, submetidos para aprovação das partes em até 15 dias corridos.



Metodologia Detalhada

A metodologia de verificação será desenvolvida pelo Verificador Independente considerando melhores práticas e detalhes operacionais necessários à aferição do sistema de mensuração.

CAPEX E FASEAMENTO

CAPEX total de R\$ 1,3 bilhão (equivalente a R\$ 5,7 mil/m²), composto por R\$ 1,0 bilhão referentes às três fases de implantação do projeto, R\$ 256,4 milhões de reinvestimentos programados ao longo do período contratual e R\$ 40,7 milhões associados a outros investimentos previstos.

CAPEX Total (R\$'MM) por Edifício e Faseamento

R\$1,3 Bi

CAPEX Total

Equivalente a R\$ 5,7 mil/m²

R\$1,0 Bi

Fase de Construção

Referentes às três fases de
implantação do projeto

R\$256,4M

Reinvestimentos

Programados ao longo do
período contratual

R\$40,7M

Outros Investimentos

Associados a outros
investimentos previstos

- **CAPEX Obrigatório: R\$ 1,1 bi;**
- **CAPEX Obrigatório com Exploração de Rec. Acessória: R\$ 1,3 bi.**

OPEX

OPEX de R\$ 80,6 milhões / ano (R\$ 357 por m² / ano), sendo serviços de manutenção predial, segurança patrimonial e limpeza os mais relevantes

R\$80,6 M

OPEX Total Anual

60,7M

OPEX Obrigatório


13,6M

OPEX Obrigatório Rec. Acessórias


6,3M

OPEX Administrativo

O&M Anual (R\$'MM) – Por Edifício

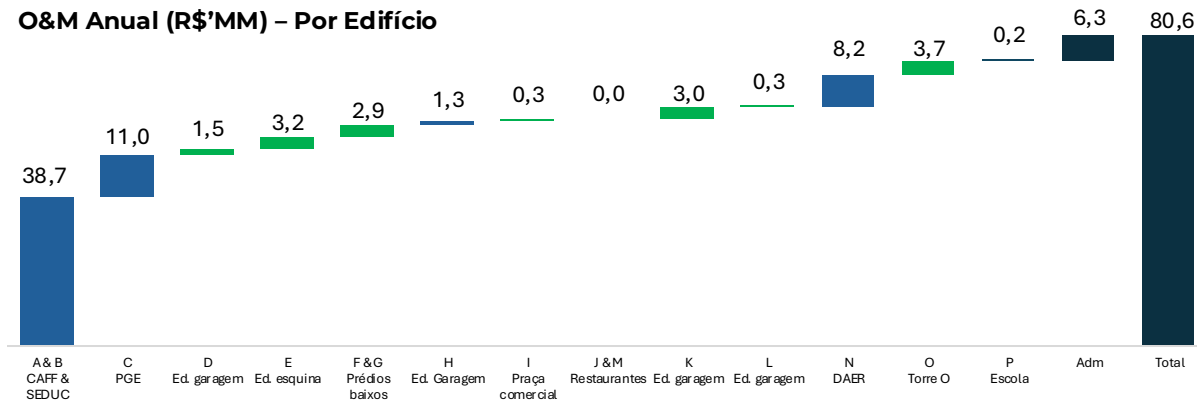

O&M Anual (R\$'MM) – Por Serviço

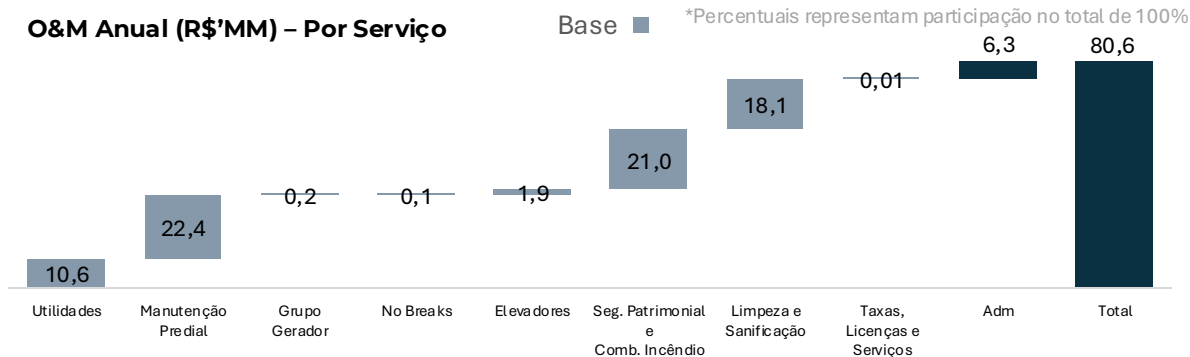

Racional de mão de obra

SERVIÇO	GERAL	A CAFF	A SEDUC	C PGE - ESCRITÓRIO
LIMPEZA, MENSAGERIA, GARÇON Obs - a variação depende do tamanho e quantidade de pavimentos e banheiros	Supervisão Serviços (1): 1 posto hor intermediário 6x1 Encarregado (2): 1 posto 6x1 Turno 1 e 1 posto 6x1 Turno 2 Aux Serv Gerais - Docas Central Resíduos (8): 4 postos 6x1 Turno 1 e 4 postos 6x1 Turno 2	Sanitarista Diurno (18): 2 agentes 6x1 para cada 3 andares Sanitarista Noturno (14): 1 agente 6x1 para cada 2 andares Ag. Limpeza Turno 1 (27): 1 agente 5x2 por andar Ag. Limpeza Turno 2 (54): 2 agentes 5x2 por andar Copeiro (26): 1 agente coml 5x2 por andar Garçom (26): 1 agente coml 5x2 por andar Mensageiro (2): 2 agentes coml 5x2 para torre	Sanitarista Diurno (2): 1 agente 6x1 para cada pavimento Sanitarista Noturno (1): 1 agente 6x1 para cada 4 andares Ag. Limpeza Turno 1 (2): 1 agente 5x2 para cada 2 andares Ag. Limpeza Turno 2 (4): 1 agente 5x2 por andar	Sanitarista Diurno (3): 1 agente 6x1 para cada 5 andares Sanitarista Noturno (2): 1 agente 6x1 para cada 8 andares Ag. Limpeza Turno 1 (4): 1 agente 6x1 para cada 4 andares Ag. Limpeza Turno 2 (8): 1 agente 6x1 para cada 2 andares Copeiro (16): 1 agente coml 5x2 por andar Garçom (16): 1 agente coml 5x2 por andar Mensageiro (1): 1 agente coml 5x2 para torre

SERVIÇO	O EDIFÍCIO INTERNO	D ESTACIONAMENTO	E EDIFÍCIO ESQUINA	F e G ESCRITÓRIOS	N DAER
SEGURANÇA PATRIMONIAL	Área Externa - 1 ponto de acesso (2): Entradas e saídas: 2 postos 12hs por ponto de acesso para cobertura 24hs Acesso ao Lobby (2): 1 por acesso para cobertura das 7hs às 23hs Recepção (2): 2 recepcionistas por lobby	Ronda moto pelo condomínio geral	Área Externa - 1 ponto de acesso (2): Entradas e saídas: 2 postos 12hs por ponto de acesso para cobertura 24hs Acesso ao Lobby 1 (2): 1 por acesso para cobertura das 7hs às 23hs Recepção (2): 2 recepcionistas por lobby	Área Externa - 1 pontos de acesso (2): Entradas e saídas: 2 postos 12hs por ponto de acesso para cobertura 24hs Acesso ao Lobby 1 (2): 1 por acesso para cobertura das 7hs às 23hs Recepção (2): 2 recepcionistas por lobby	Área Externa - 1 ponto de acesso (2): Entradas e saídas: 2 postos 12hs por ponto de acesso para cobertura 24hs Acesso ao Lobby (2): 1 por acesso para cobertura das 7hs às 23hs Recepção (2): 2 recepcionistas por lobby


Função	Turno	Escala	Valor Unitário
Equipe de Gerenciamento de Facilities			
Engenheiro Responsável - Gerente de Facilities	Comercial	5x2	38.052
Engenheiro Eletricista	Comercial	5x2	35.334
Engenheiro Civil	Comercial	5x2	27.180
Engenheiro Mecânico	Comercial	5x2	27.180
PCM – TÉCNICO	Comercial	5x2	12.661
Supervisor Hard Service	Comercial	5x2	15.827
Supervisor Soft Service	Comercial	5x2	14.771
Oficial Eletricista – Diurno	Diurno	12x36	14.973
Oficial Eletricista – Noturno	Noturno	12x36	18.552
Auxiliar de Manutenção Predial	Diurno	12x36	5.697
Auxiliar de Manutenção Predial	Noturno	12x36	6.836
Analista Administrativo / financeiro	Comercial	5x2	8.441
Técnico em segurança do Trabalho	Comercial	6x1	9.117
Bombeiro - 12hs	Diurno	Posto 12hs	21.000
Bombeiro - 12hs	Noturno	Posto 12hs	25.000
Limpeza – Gestão			
Supervisor Serviços	Intermediário	6x1	5.805
Encarregado Diurno	Diurno	6x1	5.216
Encarregado Noturno	Noturno	6x1	6.259
Limpeza – Operação			
ASG - DOCAS (Central de resíduos)	Diurno	6x1	5.216
Agente Asseio	Diurno	6x1	4.742
Agente Asseio	Noturno	6x1	5.690
Agente Hig (sanitários)	Diurno	6x1	5.216
Agente Hig (sanitários)	Noturno	6x1	6.259
Jardinagem – Operação			
Jardineiro	Comercial	6x1	6.000
Atendimento Interno – Operação			
Copeiro	Comercial	5x2	4.080
Garçom	Comercial	5x2	4.080
Mensageiro	Comercial	5x2	4.080
Marcenaria - Gestão e Operação			
Encarregado Manutenção – Marcenaria	Comercial	5x2	8.782
Oficial Marceneiro	Comercial	5x2	6.802
Oficial Pintor Pistola	Comercial	5x2	7.589
Auxiliar de Marceneiro	Comercial	5x2	5.675
Auxiliar de Manutenção Predial (marcenaria)	Comercial	5x2	5.675
Almoxarife	Comercial	5x2	6.802
Equipe de Manutenção Integrada			
Encarregado Manutenção Eletrotécnico	Diurno	6x1	13.521
Encarregado Manutenção Eletrotécnico	Noturno	6x1	20.049
Encarregado Manutenção - Edificações - (Predial)	Diurno	6x1	11.105

Função	Turno	Escala	Valor Unitário
Encarregado Manutenção - Edificações - (Hidráulica)	Diurno	6x1	11.105
Encarregado Manutenção – Edificações	Noturno	6x1	16.969
Encarregado Manutenção – Refrigeração	Diurno	6x1	13.521
Técnico em segurança do Trabalho	Comercial	6x1	9.117
Oficial Eletricista	Diurno	12x36	14.973
Oficial Eletricista	Noturno	12x36	18.552
Oficial Eletricista	Diurno	6x1	7.615
Oficial Hidráulico	Diurno	6x1	7.404
Oficial Hidráulico	Diurno	12x36	14.551
Oficial Hidráulico	Noturno	12x36	18.023
Oficial Pedreiro	Comercial	6x1	6.828
Oficial Pintor	Comercial	6x1	6.828
Oficial Serralheiro	Comercial	6x1	6.828
Oficial Gesso	Comercial	6x1	6.038
Oficial Mecânico Refrigeração	Comercial	6x1	6.085
Meio Oficial Mecânico de Refrigeração	Comercial	6x1	5.856
Auxiliar de Manutenção Predial	Comercial	6x1	5.697
Meio Oficial Manutenção Eletricista	12hs	12x36	12.829
Meio Oficial Manutenção Eletricista	Diurno	6x1	6.543
Meio Oficial Manutenção Eletricista	Noturno	12x36	15.858
Meio Oficial Manutenção Eletricista	Diurno	6x1	6.582
Meio Oficial Manutenção Eletricista	Diurno	12x36	12.908
Meio Oficial Manutenção Eletricista	Noturno	12x36	15.957
Instaladores e reparador de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados	Comercial	6x1	7.086
Almoxarife	Comercial	6x1	6.828
Equipe de BMS			
Supervisor	Comercial	6x1	15.615
Posto Técnico de Campo	7hs às 22hs	5X2	15.615
Posto Técnico de Campo	22hs às 7hs	5X2	15.615
Posto Operação - Sala BMS - 24HS	24hs	24hs	48.534
Equipe de Segurança Patrimonial			
Supervisor de vigilante	12hs	12x36	15.500
Vigilante - Ronda Moto (incluso)	12hs	12x36	15.000
Vigilante - Área Externa	12hs	12x36	14.000
Vigilante - Controle Acesso	12hs	12x36	12.500
Receptionista	Comercial	5X2	10.000
Operador CCO	24hs	24hs	64.000


- Otimização do uso de recursos humanos para melhoria dos níveis de serviço;
- Gerenciamento de facilities integrado.

RECEITAS

Ramp-up de Contraprestação por Fase (R\$'MM)

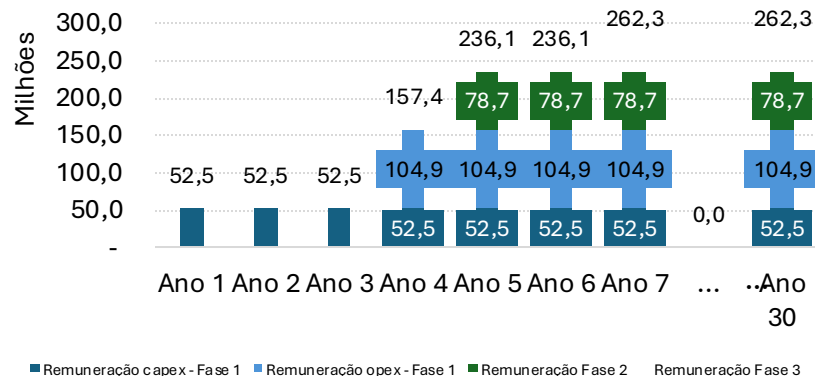

Ramp-up de Receita Acessória por Fase (R\$'MM)

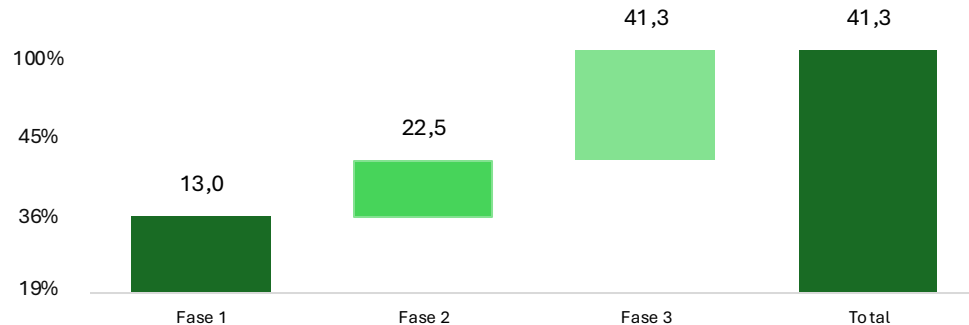

Fórmula de contraprestação mensal efetiva

$$CME = CMMáx \times FDISP \times FID$$

Fator de Disponibilidade

Fase 0:	20%
Fase 1:	40%
Fase 2:	30%
Fase 3:	10%
Após conclusão integral	100%


Fator de Desempenho

- Apuração trimestral de indicadores
- 6 meses de *waiver* do SMD para as diferentes fases
- Piso de 80% para a parcela FID

Parâmetro	Comercial	Corporativo	Estacionamento
Valor de locação (R\$/m²/mês)	120	100	–
Promoções e propaganda (R\$/m²/mês)	50	–	–
Vacância	10%	10%	–
Giro diário de vagas	–	–	1,5
Ocupação média	–	–	20%
Valor médio por vaga	–	–	R\$ 30
Repasse à concessionária	–	–	45%

VALUE FOR MONEY

Comparação a Valor Presente

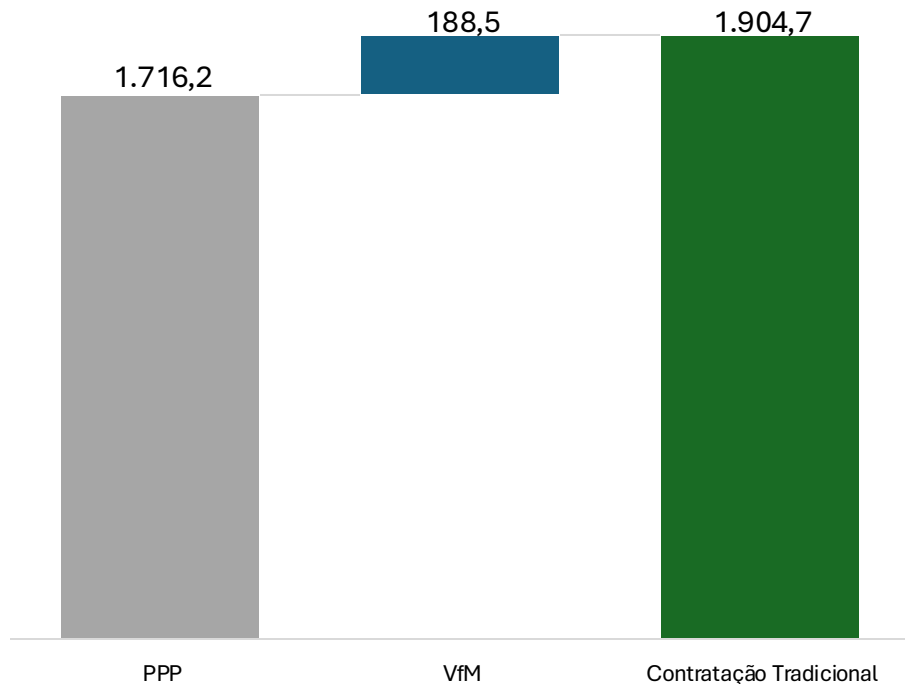

VfM da PPP

A PPP apresenta custo **R\$ 188,5 milhões menor** a valor presente frente à contratação tradicional (PSC).

Análise Qualitativa

- Transferência de Riscos;
- Garantia de Qualidade;
- Eficiência de Recursos;
- Reversibilidade do Ativo

Análise Quantitativa

- Na PPP, custo das contraprestações e gestão contratual;
- Na Tradicional, potencial de aditivos de 25% para Opex e Capex e custos de atraso;

Conclusão

O projeto via PPP apresenta **vantagens qualitativas e quantitativas** para o Estado e para a sociedade.

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA

O valor da Contraprestação Mensal Efetiva vincula-se às Unidades Prediais ativas, à disponibilidade operacional do Complexo CAFF e ao desempenho alcançado pela Concessionária, conforme auferido pelo Verificador Independente.



$$\text{CME} = \text{CM}_{\text{MÁX}} \times \text{F}_{\text{DISP}} \times \text{F}_{\text{ID}}$$

Fórmula base para determinação do valor final a ser pago



Fator de Disponibilidade (F_{DISP})

Ajuste baseado na disponibilidade física e operacional das Unidades Prediais em operação



Fator de Desempenho (F_{ID})

Ajuste conforme Índice de Desempenho apurado no trimestre anterior (varia de **80% a 100%**)



Período de Transição: Durante os dois primeiros trimestres de pagamento, a Contraprestação será calculada sem aplicação de descontos ($\text{FID} = 100\%$). Os Indicadores de Desempenho serão apurados para diagnóstico, calibração e ajuste do sistema, sem impacto financeiro para a Concessionária.

Índice de Desempenho Consolidado

O ID consolidado é calculado pela média ponderada dos IDs individuais de cada Prédio Ativo, considerando apenas as unidades destinadas à prestação de serviços ao Poder Concedente. Unidades voltadas para receitas acessórias são excluídas do cálculo.

$$\text{ID}_{\text{Consolidado}} = \Sigma (\text{ID}_{\text{Pi}} \times \% \text{DISP}_{\text{PRÉDIOi}}) / \Sigma \% \text{DISP}_{\text{PRÉDIOi}}$$

Faseamento das Obras

Cada Unidade Predial (prédios construídos conforme fase) possui um percentual de disponibilidade específico, calculado conforme a representatividade de seu valor de investimento sobre o valor total do empreendimento. A emissão da Ordem de Operação de cada unidade inaugura um período de transição próprio de 2 trimestres.

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL COMPLEMENTAR

Natureza da CMC

A Contraprestação Mensal Complementar constitui **parcela extraordinária, de natureza eventual**, devida em adição à Contraprestação Mensal Efetiva. **Não está sujeita ao limite da $CM_{MÁX}$, nem aos fatores F_{DISP} e F_{ID} .**

A CMC é devida quando mudanças de layout ou reconfigurações de espaços demandadas pelo Poder Concedente impliquem em serviços adicionais não previstos no escopo original da concessão. O pagamento ocorre no mês seguinte à prestação do serviço solicitado por meio de Ordem de Serviço Complementar.

1

Cálculo da CMC

$CMC = UCE \times CR$, onde UCE são as Unidades de Crédito Excedentes que superam o percentual previsto, e CR é o Custo de Referência estabelecido em moeda da data-base do contrato

2

Atividades Contempladas

Realocação de mobiliário entre unidades, adequação de instalações elétricas e de dados, ajustes em divisórias, e serviços correlatos que excedam obrigações ordinárias (banda de 10%)

3

Processo de Solicitação

Poder Concedente emite Ordem de Serviço Complementar detalhando o escopo. Concessionária apresenta orçamento baseado no Custo de Referência para aprovação prévia

BENCHMARKS

Indicadores	Centro Administrativo (Maceió)	Centro Administrativo (Angra dos Reis)	Sede da PGE (Rondônia)	Centro Administrativo (São Paulo)	Média Total	Média (Excluindo C.A. - São Paulo)	Complexo do CAFF
Escopo	Retrofit	Construção	Construção	Retrofit e Construção	n.a.	n.a.	Retrofit e Construção
Situação do Projeto	Contrato Iniciado	Contrato Iniciado	Contrato Iniciado	Licitação Concluída	n.a.	n.a.	Modelagem Iniciada
Data base do Projeto	jan/2025	jan/19	jan/22	jul/2025	n.a.	n.a.	dez/2025
Prazo do Contrato (Anos)	30	30	20	30	27,5	26,6	30
Prazo de Construção (Anos)	2	2	2	6	3	2	6
Valor do Contrato (R\$ Milhões)	1.746,88	1.087,13	481,78	6.193,25	2.227,24	1.105,26	7.082,1
CAPEX (R\$ Milhões)	269,89	129,99	99,49	6.193,25	1.673,16	166,46	1.332,3
OPEX (R\$ Milhões/ano)	28,31	15,03	7,85	348,91	100,02	17,06	80,6
Contraprestação Mensal Máxima (R\$ Milhões)	5,20	2,38	2,23	77,80	21,90	3,27	21,9
Contraprestação Anual Máxima (R\$ Milhões)	62,39	28,57	26,77	933,50	262,82	39,24	262,3
Aporte (em R\$ Milhões)	57,53	43,69	n.a.	34.533,36	1.184,86	50,61	n.a.
Área do Terreno (m²)	3.156,17	5.735,00	-	53.920,00	20.937,06	4.445,59	122.051,00
Área Construída (m²)	16.663,42	23.240,00	8.697,00	219.331,00	66.982,86	16.200,14	257.792,00
Qtd. Usuários	1.460	1.045	393	22.695	6.398	966	12.792
Capex por m² (R\$ Milhares / m²)	16,20	5,59	11,44	19,03	13,07	11,08	5,70
Opex anual por m² (R\$ Milhares / m² / ano)	1,70	0,65	0,90	15,01	4,57	1,08	0,36
Contraprestação Anual por m² (R\$ Milhares / m² / ano)	3,74	1,23	3,08	40,17	12,06	2,68	1,16
WACC Real Médio	10,75%	11,20%	8,47%	9,89%	10,08%	10,14%	10,23%

LICITAÇÃO

Objeto

- Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de **Concessão Administrativa, para a realização de Reformas, Equipagem, Operação, Manutenção e Exploração do Centro Administrativo Fernando Ferrari ("CAFF"), no Município de Porto Alegre/RS.**

Modalidade da Licitação

- Concorrência Internacional com o critério de julgamento de menor valor de contraprestação mensal

Prazo


- 30 anos

Obras

- 72 meses para conclusão das obras, divididas em 3 fases modulares

Local da Sessão Pública

- Sede da B3

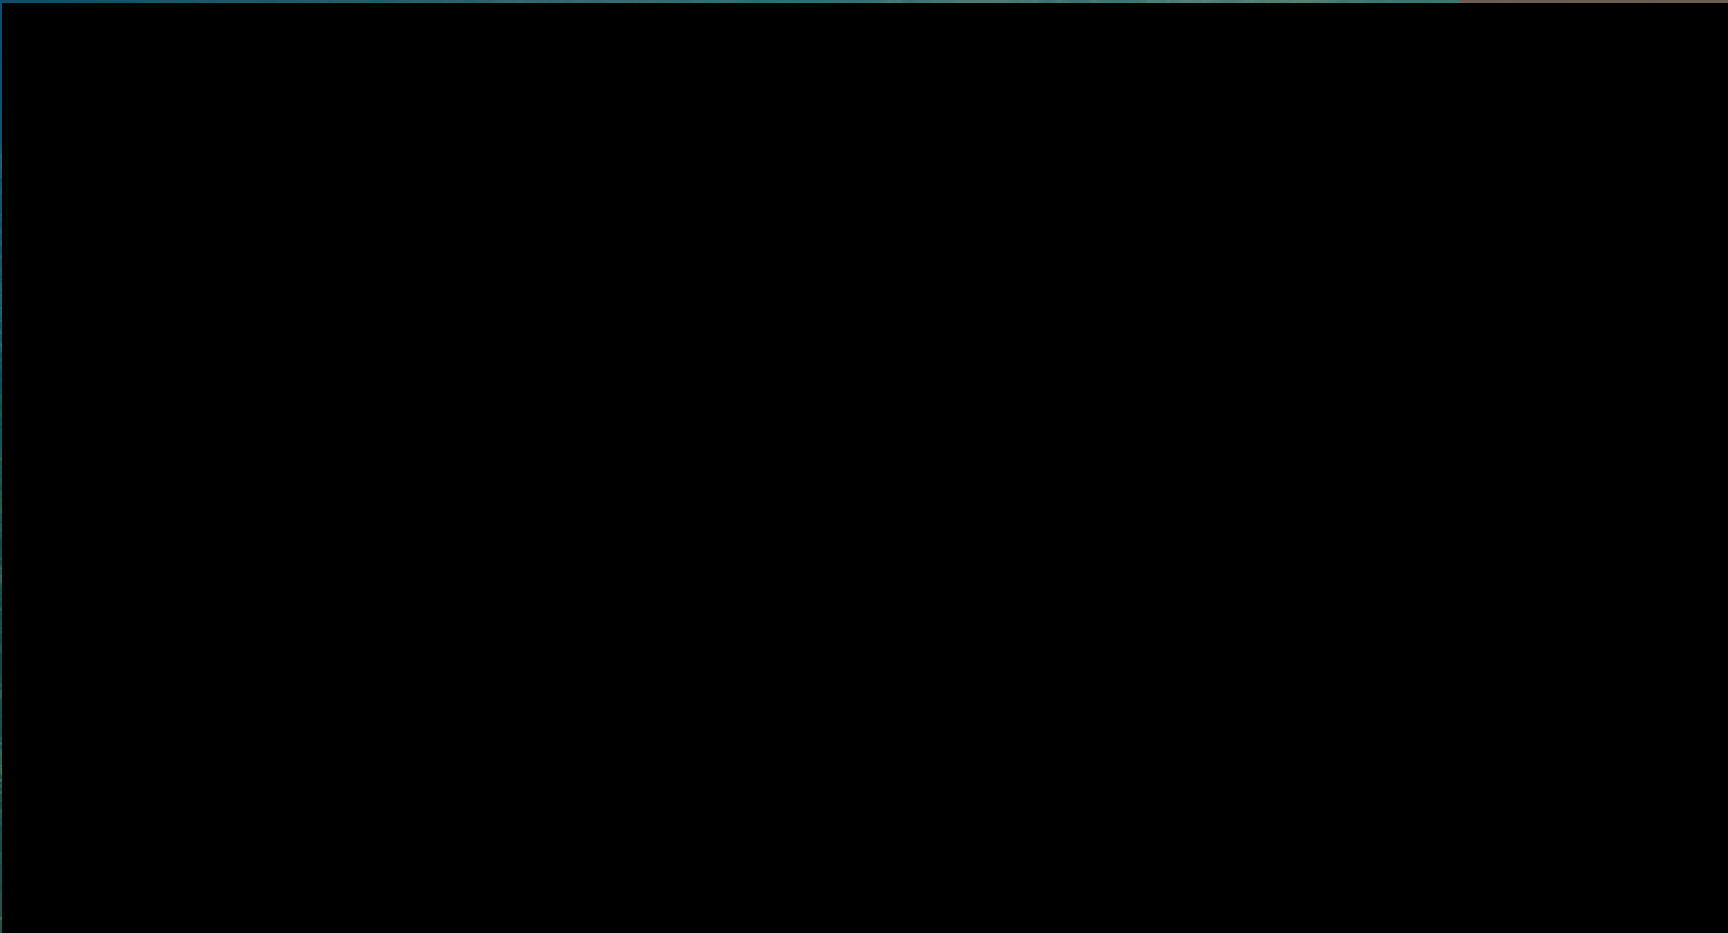

VISTA
NOVO ACESSO CAFF



VISTA
EXPANSÃO CAFF



VISTA
AV. BORGES DE MEDEIROS



VISTA
AUGUSTO DE CARVALHO



**VISTA
AUGUSTO DE CARVALHO
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO**



VISTA
PRAÇA EXTERNA NORTE




IMAGEM AÉREA



IMAGEM AÉREA



IMPLANTAÇÃO

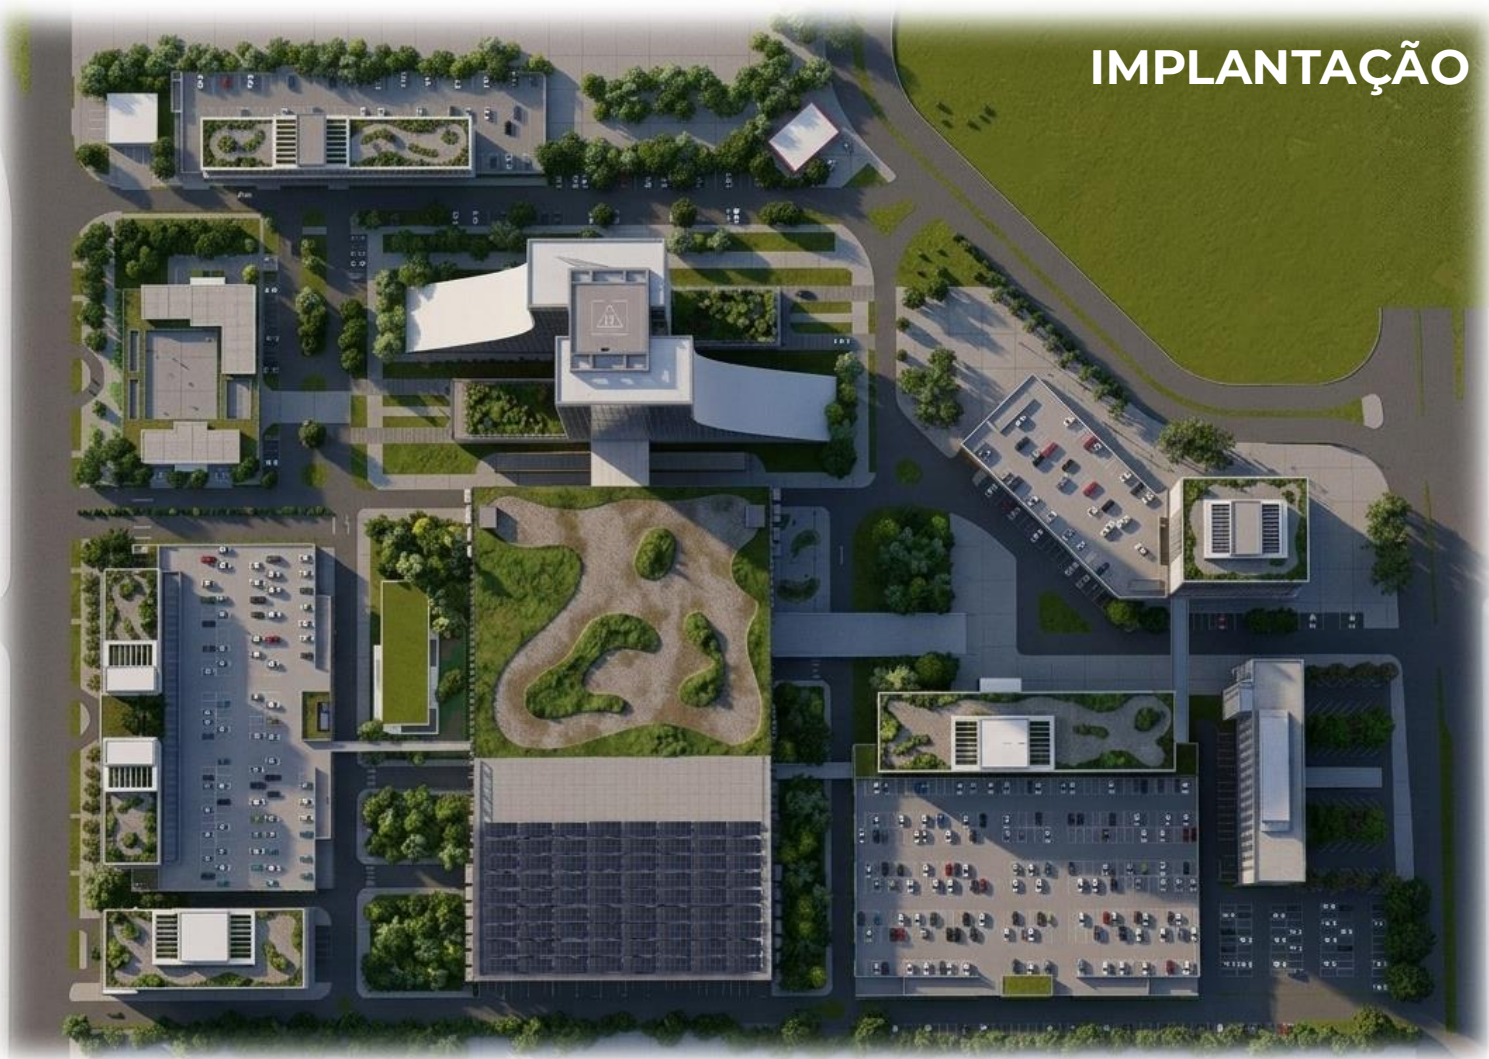

PARECER PRÉVIO

Finalidade

- Subsidiar a análise do Conselho Gestor sobre a adequação da PPP do CAFF às diretrizes do Programa de Concessões e PPP do Estado.

Conteúdo

- Estimativas de CAPEX e OPEX
- Informações sobre licitação, seguro e garantias do projeto
- Apresentação das premissas, conveniência e oportunidade do projeto
- Aspectos econômicos: forma de remuneração, fonte de recursos, impacto orçamentário-financeiro
- Condições de financiamento do projeto, análise de Value for Money e premissas macroeconômicas

Pontos de atenção antes da publicação do edital

- Revisão final da modelagem jurídica pela PGE para assegurar conformidade legal
- Alinhamento institucional e governança, com definição clara de papéis na fase de operação
- Utilização do FPE como garantia subsidiária e aplicação do RRF ✓

Recomendação

- **Inclusão do Projeto no Programa** de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Estado do Rio Grande do Sul, assim como a **abertura da Consulta Pública** e **envio ao Tribunal de Contas (TCE/RS)**

RESOLUÇÃO N° 72/2026



O Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Estado do Rio Grande do Sul – CGCPPP/RS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto n° 53.495, de 30 de março de 2017, com alterações do Decreto n° 54.499, de 10 de fevereiro do 2019 e Decreto n° 55.791, de 13 de março de 2021, em reunião realizada em 17 de março de 2026; e considerando o que consta nos processos administrativos n° 25/0400-9000003-5 e 26/0400-0000227-6.

RESOLVE

Art. 1º Aprovar o Parecer Prévio UCPPP n° 03/2026, que trata do projeto de **Parceria Público-Privada, na modalidade de Concessão Administrativa, para a reforma, equipagem, operação e manutenção do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), bem como exploração da área do terreno do CAFF;**

Art. 2º. Acolher as recomendações exaradas pela Unidade Executiva do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas e **autorizar a abertura de Consulta Pública;** e

Art. 3º Incluir, no Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Estado do Rio Grande do Sul, o projeto de **Parceria Público-Privada, na modalidade de Concessão Administrativa, para a reforma, equipagem, operação e manutenção do CAFF e exploração de seu terreno.**



CRONOGRAMA

- ▶ Compartilhamento das minutas do Edital e Contrato;
- ▶ Assinatura da ata com a aprovação do CGCPPP;

Em seguida:



Obrigado

Pedro Capeluppi

Secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha

Angela de Oliveira

Secretária Adjunta de Estado da Reconstrução Gaúcha



/governodoRS



@governo_rs



@governo_rs



/governors

rs.gov.br



GOVERNO
DO ESTADO
**RIO
GRANDE
DO SUL**

